

การจัดหาพัสดุในส่วนของการจ่ายลงทุนในภาพรวม


ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561




ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		อยู่ระหว่างการดำเนินการ		อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเข้ากระบวนการ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1.	ครุภัณฑ์งานประจำ							
	-ฝ่ายการพัสดุจัดหา	72.52	72.52	100				
	-หน่วยงานจัดหาเอง	125.88	79.45	63.12	46.43	36.88		
	รวม	198.40	151.97	76.60	46.43	23.40		
2.	ครุภัณฑ์งานโครงการ	2,353.06	1,410.90	59.96	468.50	19.91	473.66	20.13
3.	ครุภัณฑ์งานสนับสนุน	466.17	204.95	43.96	10.97	2.35	250.25	53.68
4.	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,143.28	3,430.70	82.80	91.93	2.22	620.67	14.98
	รวมทั้งสิ้น	7,160.91						

สรุปภาพรวม


จำนวนโครงการทั้งหมด 29 โครงการ

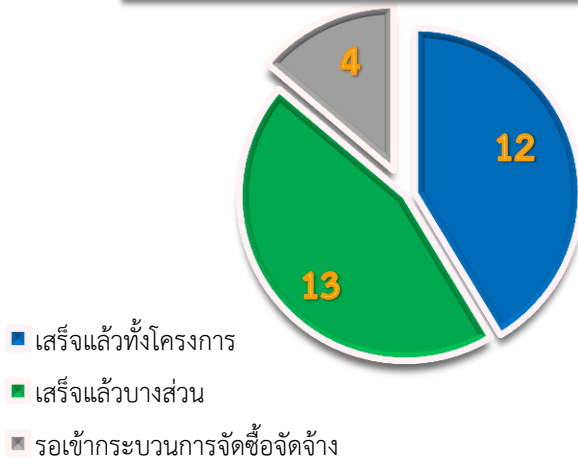


งานสนับสนุนทั้งหมด 13 โครงการ

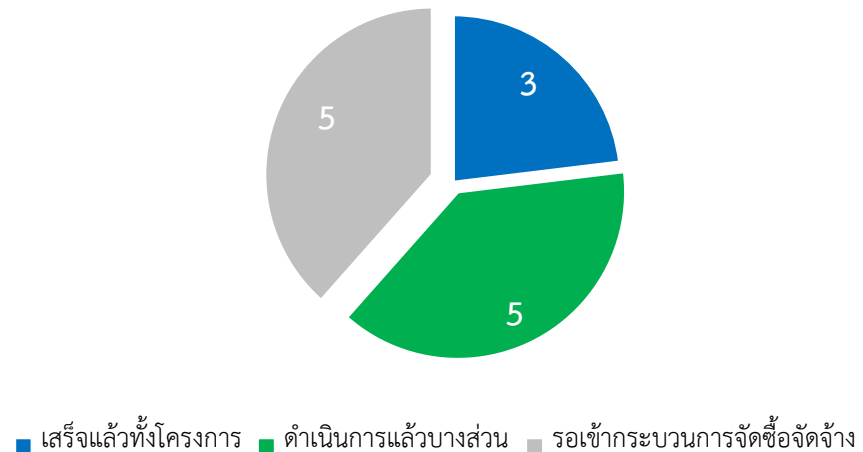

ที่ดิน สิ่งก่อสร้างทั้งหมด 9 โครงการ

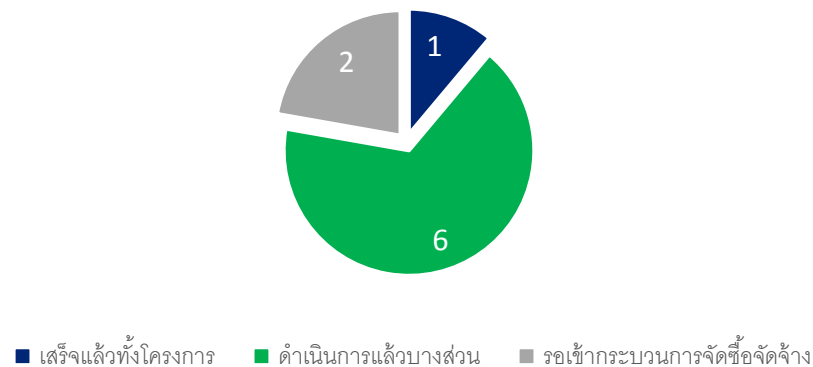

จำนวนโครงการทั้งหมด 29 โครงการ



- เสร็จแล้วทั้งโครงการ
- เสร็จแล้วบางส่วน
- รอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์
“งานโครงการ”

ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device	8.00	
2.	โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา	6.15	
3.	โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity	50.00	
4.	โครงการ Digital Branch	181.74	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุด VTM - อยู่ระหว่างหน่วยงานปรับ TOR

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook แบบที่ 1 จำนวน 162 เครื่อง	3.07	17.10
จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมฯ Desktop Management System จำนวน 998 Licenses	2.02	0.04

2. โครงการ Application เพื่อใช้ในการบริหารหนี้

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
จ้างทำ Application เพื่อใช้ในการบริหารหนี้	40.93	19.07

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. ซื้อ Notebook 6 เครื่อง และไมโครคอมพิวเตอร์ 339 เครื่อง	6.83	5.96
2. ซื้อ UPS 5 KVA	1.52	
3. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โทรสารและสแกนเนอร์	0.87	
4. ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 17 เครื่อง	0.47	
5. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โน้ตบุ๊ก และไมโครคอมพิวเตอร์	3.68	
6. ซื้อ Desktop Management System 541 Licenses	1.10	0.13
7. ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 664 Licenses	1.60	

4. โครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	16.12	3.33
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14.98	-

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

5. โครงการพัฒนาบุคลากร

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างออกแบบและผลิตสื่อหลักสูตร SMEs Credit Pathway	8.96	-
2. จ้างออกแบบและผลิตสื่อชุดหลักสูตรสมรรถนะบุคลากร	2.87	-
3. จ้างออกแบบและผลิตสื่อหลักสูตร Market Conduct	1.90	-

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
จัดหาและพัฒนาสื่อเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning จำนวน 9 หลักสูตร (จากทั้งหมด 35 หลักสูตร)	4.17	38.71

6. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. จ้างพัฒนา Service ให้รองรับการชำระเงินพร้อมเพย์ผ่าน QR Code	4.99	81.63
2. จ้างพัฒนาระบบงานฯ รองรับการชำระเงินฯ สำหรับพัฒนาระบบ CBS	5.83	
3. ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเพิ่มขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงาน	7.87	

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. จัดซื้อ UPS ไม่น้อยกว่า 5 KVA	19.42	204.80
2. จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Internet Banking	7.49	
3. ซื้อระบบบริการจัดการเงินสดของศูนย์เงินสดสาขาและเครื่อง ATM	9.33	
4. ซื้อสิทธิการใช้งาน จำนวน 300 Licenses	5.20	
5. ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน 132 สาขา	67.05	
6. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการสาขา จำนวน 596 เครื่อง		
7. ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HP Nonstop	365.02	
8. ซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Office จำนวน 3,700 Licenses	63.18	

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ ICAS	145.72	ขายแบบ 16-27 พ.ย.61

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

8. โครงการปรับปรุงความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน PCI DSS

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
Key Management พร้อมติดตั้งและบริหารจัดการ Key	1.67	-

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. ซื้อหน่วยความจำหลัก RAM สำหรับ Virtualization Server	0.24	2.73
2. ซื้อระบบ RADIUS Server และ Endpoint Base License 2500 Licenses	2.73	
3. ซื้อระบบ Next Generation	6.86	
4. License สำหรับระบบ Data Loss Prevention	1.74	
5. ซื้อระบบจัดเก็บ Log และเฝ้าระวังภัยคุกคามบนฐานข้อมูลของผู้ถือบัตร (Centralized Database Activity Monitoring)	10.02	

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

9. โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud Detection

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อระบบงาน Application Fraud Detection	52.28	ยื่นซองข้อเสนอ 14 ธ.ค.61 เปิดซองเสนอราคา 19 ธ.ค.61

10. โครงการอาคาร Data Center

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดหาระบบบูรณาการและแสดงผลสำหรับ Network and Security Operation Center	19.74	เปิดซอง 21 พ.ย. 61
2. จัดหาระบบโทรศัพท์ Soft Phone	16.30	นำเสนออนุมัติจ้าง 6 ธ.ค. 61
3. ซื้อระบบ Wireless LAN	27.11	นำเสนออนุมัติจ้าง 7 ธ.ค. 61

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. จัดหาอุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่	42.75	63.15
2. จ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่	50.00	
3. จัดหาระบบ IP Address Management	3.71	
4. จัดหาระบบ Root Cause Analysis	23.71	

ครุภัณฑ์งานโครงการ



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

11. โครงการเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ Self Service Outsourcing

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
เช่าใช้บริการพร้อมบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Cloud Based Service)	99.43	รับซอง 20 ธ.ค. 61 เปิดซองเสนอราคา 24 ธ.ค.61

12. โครงการจัดหา API Management

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
จ้างพัฒนาระบบ API Management (พณ.ป.005)	57.92	อธส. เห็นชอบดำเนินการ 13 พ.ย.61

13. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาด และทรัพย์สินรอการขาย

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
จ้างพัฒนาระบบทรัพย์สินรอการขายฯ	50.00	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจสอบเอกสาร เติมนำเสนอรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ

ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการ



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	โครงการธนาคารโรงเรียน	15.00	จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน Virtual School Bank
2.	โครงการ Centralize EJ & Reconciliation	25.68	ซื้อระบบ Centralize EJ & Reconciliation
3.	โครงการจัดหาระบบ Card M Pre-Production	9.80	ซื้อระบบ Card M Pre-Production
4.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา และ DR Site ของระบบงาน GIS	23.75	จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและ DR Site ของระบบงาน GIS
5.	โครงการพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง เพื่อการจัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring)	53.47	จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ Application Scoring Model
6.	โครงการพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด (Application Scoring Model)	42.68	จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ Application Scoring Model
7.	โครงการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม	24.32	จ้างพัฒนาระบบ Credit Scoring Model
8.	โครงการพัฒนาระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) รองรับการเชื่อมโยงกับระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR)	3.00	จ้างพัฒนาระบบแบบจำลองฯ


ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการ



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบ ประมาณ	หมายเหตุ
9.	โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9	205.20	จ้างพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9
10	โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization	157.18	ซื้อและพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization
11	โครงการจัดการระบบ Version Control and Continue Deployment	8.62	จัดการระบบ Version Control and Continue Deployment
12	โครงการปรับปรุงระบบ ITSM (IT Service Management)	51.69	ซื้อระบบ ITSM (IT Service Management)

งานสนับสนุนทั้งหมด 13 โครงการ

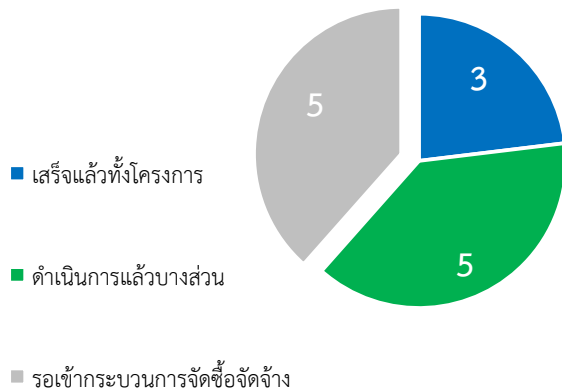

ครุภัณฑ์
“งานสนับสนุน”

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1.	งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก	2.00	
2.	งานสนับสนุนการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	5.00	
3.	งานพัฒนา Application Process System (APS)	5.00	
4.	งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการตรวจจับการทุจริต (Integrated Fraud Management System and Method)	2.30	
5.	งาน Queue Application	5.69	

ครุภัณฑ์งานสนับสนุน



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. งานให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จัดซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศสำหรับ หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 4 เครื่อง	0.72	เห็นชอบดำเนินการ 4 ธ.ค. 61

2. งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต	5.95	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจสอบเอกสาร เพื่อจัดทำรายงานผล

3. งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน GSB CIB	9.89	นำเสนอขอเห็นชอบ 6 ธ.ค. 61

ครุภัณฑ์งานสนับสนุน



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (ต่อ)

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. จ้างพัฒนาระบบงานฯ เพื่อเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง	2.89	229.50
2. จ้างพัฒนาระบบงานฯ รองรับการชำระเงินฝากฯ ผ่าน PD Teller	2.96	
3. จ้างพัฒนาระบบงานฯ ระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) รองรับการส่ง Confirmation ผ่าน e-mail	2.00	
4. จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR API	7.24	
5. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS	17.50	
6. จ้างปรับปรุงระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS	3.86	
7. จ้างพัฒนาระบบงาน ICAS ให้รองรับระเบียบและข้อกำหนดของ ธปท.	5.87	
8. จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน Card M เพื่อรองรับบริการ Bill Payment	3.41	
9. จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบริการ Bill Payment	6.25	

4. งานพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic)

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จัดหาและพัฒนาฯ Customer Data Analytics Tools	4.30	อยู่ระหว่างนำเสนอขยเล็ก

ครุภัณฑ์งานสนับสนุน



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

5. งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด สนง. อาคาร 1,2,3 และอาคาร 15	12.26	0.34
2. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสินภาค/เขต/สาขา (ซื้อ 127 แห่ง)	22.71	
3. ระบบเสียงตามสายอาคาร 17	1.22	
4. ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Door Access Control) อาคาร 2 อาคาร 3, อาคาร 15 และอาคาร 17	1.30	
5. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้อง Generator room	1.61	

ครุภัณฑ์งานสนับสนุน


ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการ



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1.	งานพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน	4.60	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับรายการข้อมูล ธุรกรรมในยุคดิจิทัล
2.	งานจัดซื้อรถโมบายทดแทน	38.00	ซื้อรถโมบายทดแทนพร้อมดัดแปลง
3.	งานซื้อระบบ Wealth Management	71.27	ซื้อระบบ Wealth Management

“ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง”

ที่ดิน สิ่งก่อสร้างทั้งหมด 9 โครงการ

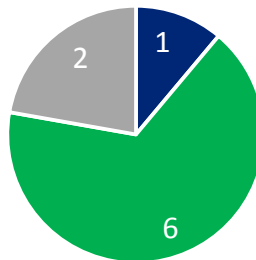

■ เสร็จแล้วทั้งโครงการ ■ ดำเนินการแล้วบางส่วน ■ รอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ที่อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการ Digital Branch	24.16	ซื้อครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงอาคาร -
2.	โครงการอาคาร Data Center	77.00	จัดหาและตกแต่งภายในอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3-8 - อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดทำ TOR และราคากลาง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
ปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 36 ศูนย์ (จากทั้งหมด 74 ศูนย์)	63.30	12.18

2. โครงการก่อสร้างทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุง ช่องทางการให้บริการสาขาเดิม

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ทดแทนสำนักงานเดิม จำนวน 4 สาขา (จากทั้งหมด 8 สาขา)	14.39	466.11
2. งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ Safe Box	19.47	
3. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่อง Self Service	10.28	
4. ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจำเป็นเร่งด่วน	6.93	

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ที่ดินดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. โครงการก่อสร้างทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุง ช่องทางการให้บริการสาขาเดิม (ต่อ)

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขานครสวรรค์	14.91	รอนำเสนอยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการทัน หน่วยงานใช้วิธี e-bidding
2. ก่อสร้างอาคารสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	12.51	
3. ปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	38.30	
5. ปรับปรุงดัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อม สำนักงานธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 4 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	9.95	รธส.ปก. เห็นชอบดำเนินการ 22 พ.ย. 61
6. ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 18 จำนวน 10 สาขา (พณ.พ.202)	2.94	รธส.ปก. เห็นชอบดำเนินการ 27 พ.ย. 61
7. ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 15 จำนวน 8 สาขา (พณ.พ.243)	1.97	ฝบอ. เห็นชอบดำเนินการ 23 พ.ย. 61
8. ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 16 จำนวน 15 สาขา (พณ.พ)	4.67	นำเสนออนุมัติจ้าง 3 ธ.ค.61
9. ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 3 จำนวน 8 สาขา	0.55	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
10. ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 11 จำนวน 6 สาขา	1.37	

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ดินดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา

ที่ดินดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. ซื้อที่ดิน/ที่ดินพร้อมอาคาร	76.16	1.54
2. ค่าครุภัณฑ์พร้อมงานจ้างปรับปรุง	15.44	6.44

4. โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย

ที่ดินดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	17.35	8.01
2. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ดำเนินการแล้ว 17 ศูนย์ (จากทั้งหมด 18 ศูนย์)	31.84	0.56

5. โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

ที่ดินดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
จ้างก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น	2,975.00	-
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	89.79	อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดทำ TOR และราคากลาง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วน และที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

6. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงิน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
1. จ้างปรับปรุงสำนักราชดำเนิน	123.30	43.50
2. ปรับปรุงพื้นที่ส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน	36.40	13.16
3. งานปรับปรุงกรณีเร่งด่วน 3.1 ปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก 3.2 ซ่อมระบบจอ LED Display ระบบควบคุมฯ หอประชุมบุรฉัตร 3.3 ปรับปรุงห้อง รรส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 1 3.4 ซ่อมพร้อมติดตั้งลิฟต์ อาคาร 17 3.5 ปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 1 3.6 ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ภายในสนญ อาคาร 9 ชั้น 10 3.7 ปรับปรุงสนง.ชั่วคราว (ผง.) ส.พหลฯ ส.ธุรกิจเงินฝาก	10.82	19.18
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซ่อมพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 สนญ.	4.73	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผล
2. ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 พร้อมระบบกันซึมพื้นที่บริเวณคาดฟ้า	29.00	-
3. ซ่อมพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน/เพิ่มเติม	6.76	-

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการ



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1.	งานบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารสำนักงานใหญ่	30.00	ปรับปรุงแบบพื้นที่ อาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10
